


Q : 複数の工程表を、一つの工程表に統合したい

- 今回は「複数の計画取込みと統合」についてレクチャーします。
別々の計画（工程's ファイル）を取込み・統合して、1つの新規計画ファイルを作成し、編集することができます。他の計画とのスケジュール調整を行う場合に便利です。

計画の統合イメージ

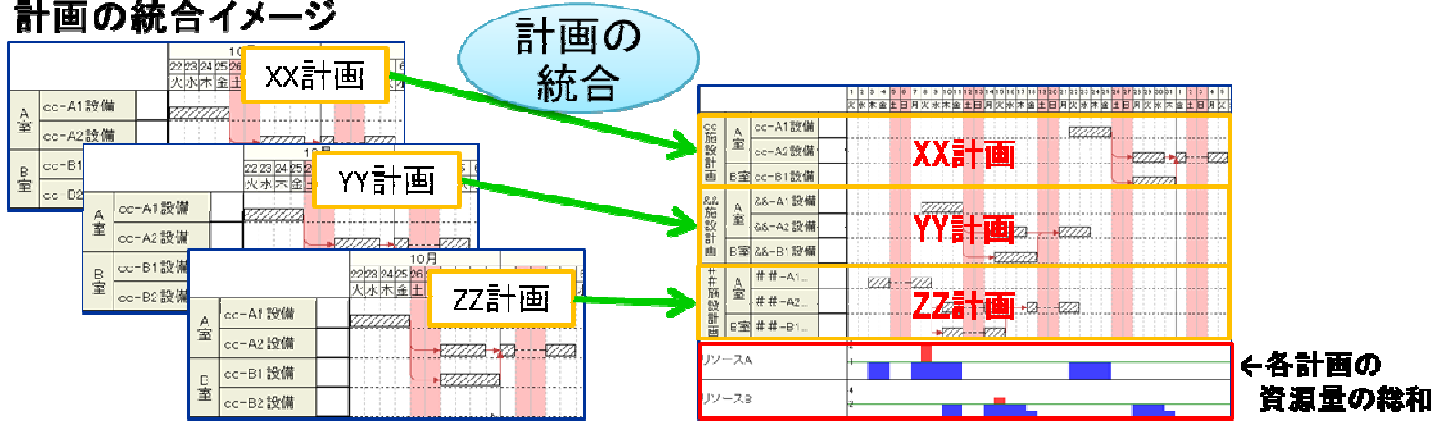

A : 「複数プロジェクトの取り込みウィザード」に従って工程表を統合しましょう。

- ① [ファイル]メニュー > [複数プロジェクトの取り込み ウィザード]をクリックする。
- ② [機能の説明] 画面で [次へ] をクリックする。
- ③ [複数プロジェクトの取り込み ウィザード-ファイル選択] 画面でマスターファイルと取り込む工程's ファイルを指定して [完了]ボタンをクリックする(下図詳細)。

複数プロジェクトの取り込み ウィザード - ファイル選択

- マスターファイル名:** マイルストーンを取り込む (ここをクリックして[開く]ダイアログにてマスターファイルを選択します。)
- ファイル名リスト (取込み順):**
 - マイルストーンを取り込む (ここをチェックするとマスターファイルのマイルストーンを取り込みます。)
 - リストへ追加... (ここをクリックして[開く]ダイアログにて統合する計画ファイル(工程's)をリストに追加します。)
 - リストから削除... (ここをチェックすると選択したファイルをリストから削除します。)
 - ↑ (ここをチェックすると選択したファイルを上または下に移動して、取込み順序を変更します。)
 - ↓
- 完了** (マスターファイルと統合する計画ファイルを設定したら[完了]ボタンをクリックします。)

【計画統合時の注意点】

- 1) 計画統合時の取り込み順序は、[複数プロジェクトの取り込み ウィザード - ファイル選択]画面 > ファイル名リスト(取込み順)によります。
- 2) 統合ファイルの第1階層には、統合した計画のプロジェクト名称が表示されます。
- 3) 統合工程表は、統合元の工程表とは独立した、新規に作成される工程'sファイルであり、統合後編集することができます。但し、編集内容は元の工程'sファイルに反映することができません。
(ウェブアイ製 PREGARE を利用すると、計画の結合後、編集・分解することで編集内容を各々元の工程'sファイルに反映することができます。)
- 4) マスターファイルの編集期間が統合工程表の編集期間となるため、マスターファイルの編集期間は統合する計画の編集期間より長くしておくことを推奨します。
